



UNSERE GRÜNE  
GLASFASER



Ralph Wehberg

21.11.2024

powered by **Allianz** 


# Einwohnerversammlung Heitersheim

CONFIDENTIAL LEVEL

# Netzausbau unter Berücksichtigung einer Insolvenz


- Die UGG hält sich an die eingegangenen Verpflichtungen nach MoU und wird den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur Gemeinde abschließen
- Herausfordernde Vertragsabwicklung des Bauvertrags der Ezentis mit dem Insolvenzverwalter
- Erstellung eines Einzelbauvertrags zur Finalisierung des Glasfaserausbaus mit dem neuen Ausbaupartner (Insyte) unter Berücksichtigung von Gewährleistungen und Baukosten
- Verfügbarkeit von Bauarbeitern auf dem Arbeitsmarkt

# Aktueller Ausbaustatus Glasfasernetz Heitersheim

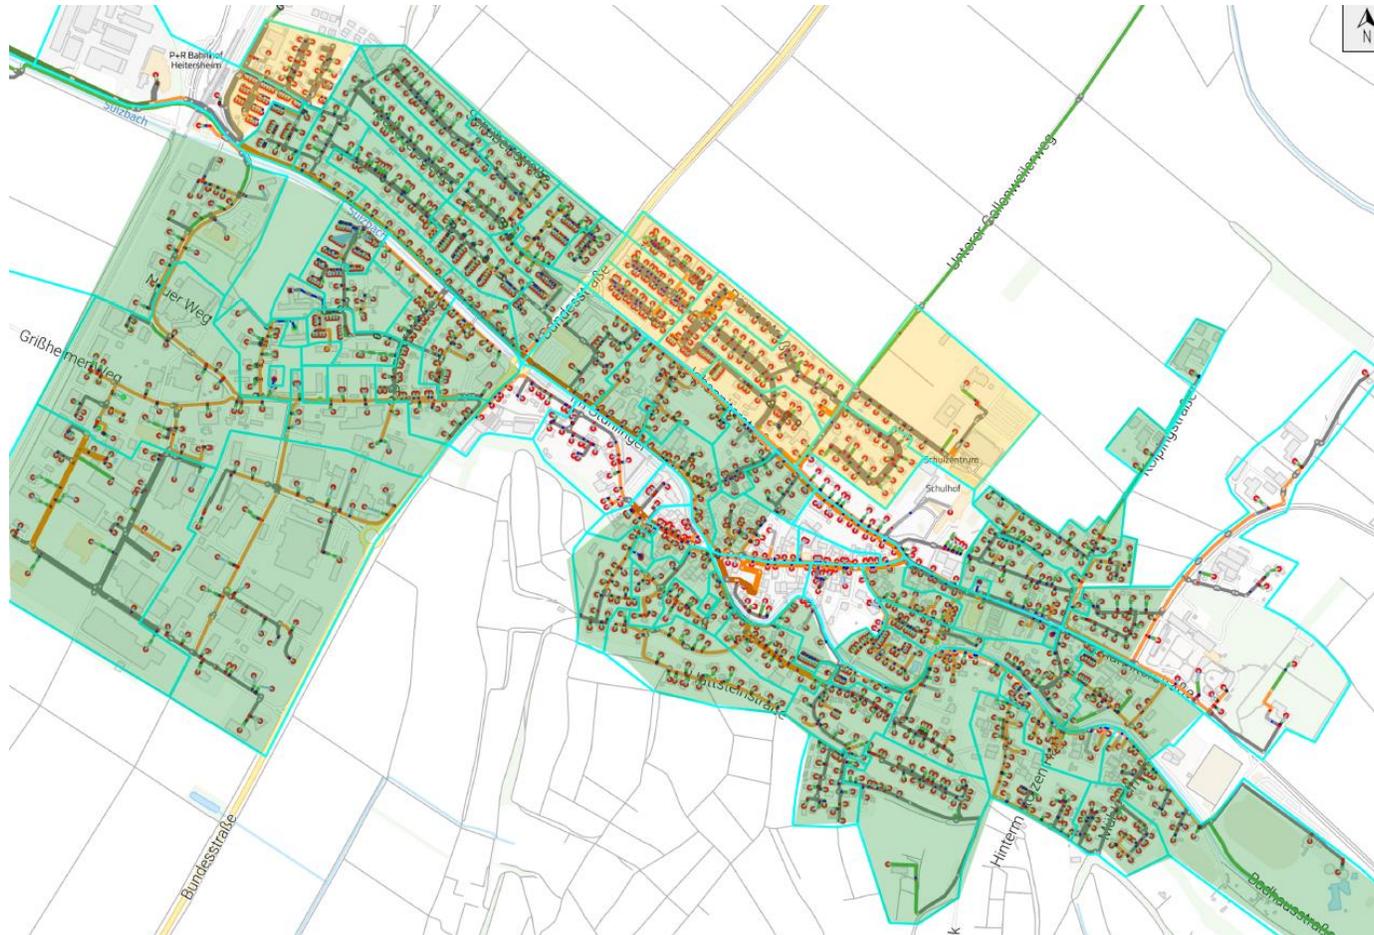

- OT Gallenweiler nicht dargestellt, jedoch ausgebaut
- Grün dargestellte Fläche – Bau abgeschlossen durch InSYTE
- Gelb dargestellte Fläche – Bau abgeschlossen durch Ezentis
- Nicht eingefärbte Flächen – Bau noch nicht abgeschlossen

# Bereiche in denen der Bau noch nicht abgeschlossen ist

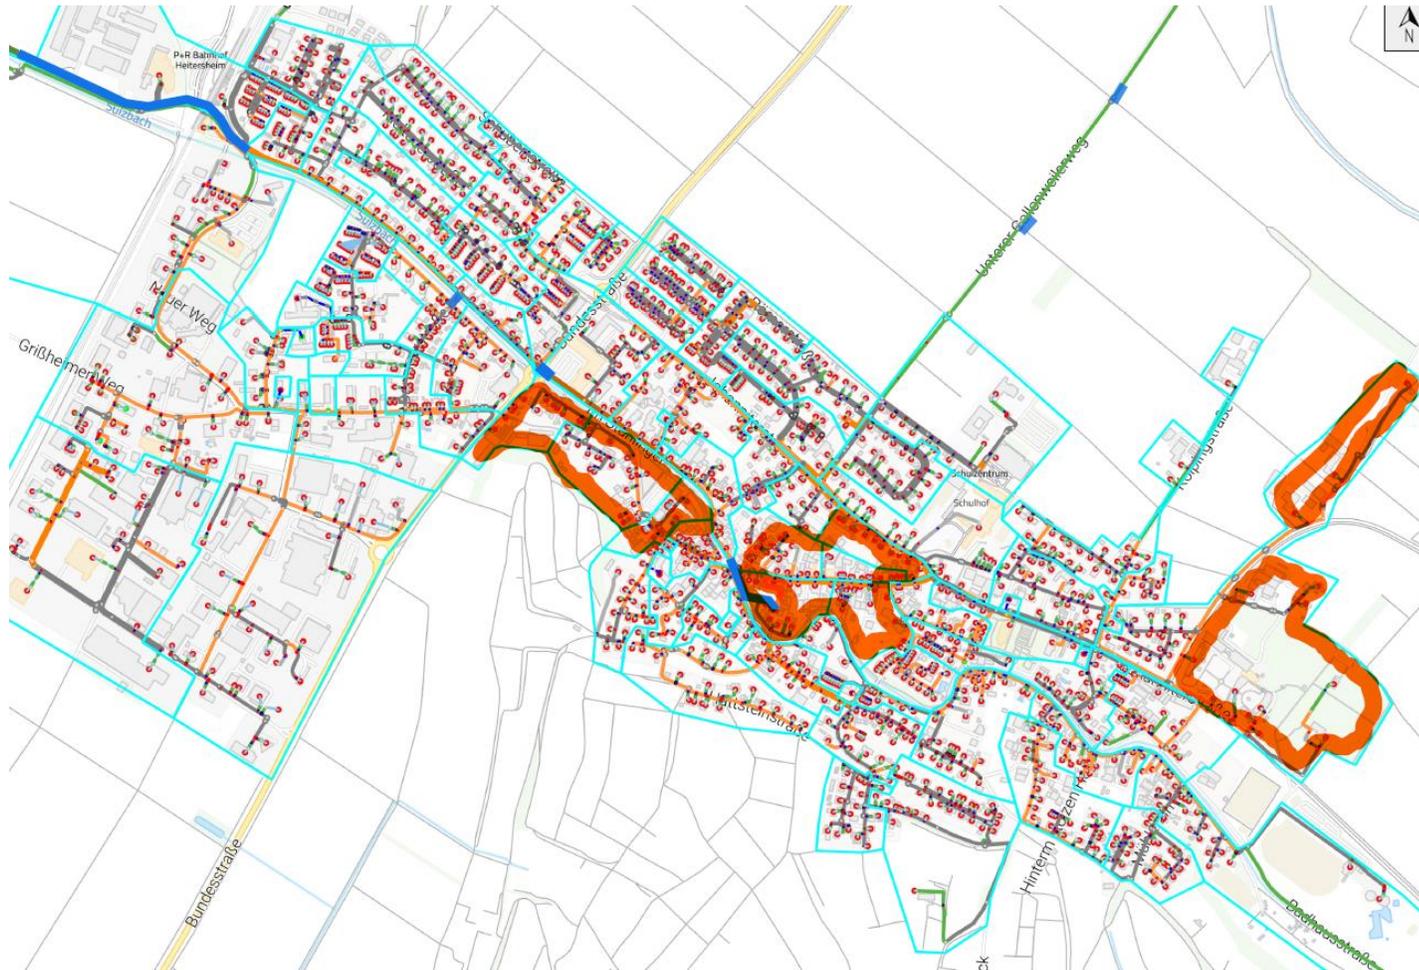

- Blau dargestellt
  - Einzelne Streckenabschnitte Anbindung Gallenweiler
  - Streckenabschnitte Backbone
- Orange dargestellt
  - Noch zu erschließende Gemeindebereiche

# Gesamtüberblick Ausbauprojekt Heitersheim



- Homes Past\* insgesamt 3106
- Von 92 Verteilern (DP) sind 66 fertig ausgebaut
- Ausgebaut sind 2440 Homes Past
- Noch zu bauen sind 666 Homes Past
- Wesentliche Anteile der Backboneanbindung Richtung Eschbach sind fertiggestellt
- Geplantes Fertigstellungsdatum Juni 2025

\*Homes Past = Wohneinheiten, die wir mit dem Netz erreichen
